

SPRINT RETROSPECTIVE

Sprint 3 • 22 de febrero – 28 de febrero de 2026

Proyecto OddsEngine | FIS_2610_3517_G2
Pontificia Universidad Javeriana

3 Commits	3 PRs Mergeados	47+ Issues Creados	5 Integrantes Activos
--------------	--------------------	-----------------------	--------------------------

1. Información General del Sprint

Proyecto	OddsEngine — Plataforma de análisis probabilístico de apuestas deportivas
Repositorio	github.com/puj-course/FIS_2610_3517_G2
Sprint	Sprint 3
Período	22 de febrero – 28 de febrero de 2026
Duración	7 días (1 semana)
Sprint anterior	Sprint 2 • Feb 16 – Feb 20, 2026
Scrum Master	Sleppyhed, Kerosene21
Equipo	Kerosene21, Nicosanlucon, Sleppyhed, Lcks07, Sleppyhed

2. Objetivo del Sprint

Realizar el refinamiento completo del backlog (HU-02 a HU-08), estructurar el equipo SCRUM formalmente e integrar los cambios de documentación generados en el Sprint 2, estableciendo así una base sólida para el inicio de la implementación técnica en sprints posteriores.

3. Actividad del Sprint

3.1 Commits Realizados

Fecha	Hash	Mensaje	Autor	Tipo
Feb 24	3e9436a	Revise project team structure and roles	Sleppyhed	docs
Feb 24	e66257d	Fix formatting in README.md for team roles	Sleppyhed	docs
Feb 24	0d4e286	Revise SCRUM roles and add new team members	Sleppyhed	docs

Observación: Solo 3 commits en la semana, todos de un mismo contribuidor (Sleppyhed) y todos de tipo documentación. No se registró actividad de código fuente durante este sprint.

3.2 Pull Requests

PR #	Título	Autor	Estado	Revisión
#92	Actualizaciones tallerGit	JuanParias29	✓ Mergeado	Aprobado
#91	Revert 'chore: agregar templates y workflow CI'	Kerosene21	✓ Mergeado	Changes requested
#89	Cambios en el README	Nicosanlucon	✓ Mergeado	Aprobado
#90	Prueba juan	Sleppyhed	✗ Cerrado sin merge	Prueba
#88	Features david	Kerosene21	✗ Cerrado sin merge	Prueba david

3.3 Issues Creados — Refinamiento de Backlog

Durante este sprint se realizó una sesión masiva de refinamiento de backlog. Kerosene21 creó sistemáticamente todas las Historias de Usuario y sus sub-tareas técnicas para los sprints futuros:

Historia de Usuario	# Issues	Responsable Backlog	Sub-tareas creadas
HU-02: Selección y Construcción de Combinada (#36)	8	Kerosene21 / Sleppyhed	T2.1 – T2.8
HU-03: Análisis estadístico de un partido (#37)	5	Kerosene21	T3.1 – T3.5
HU-04: Cálculo de probabilidad individual (#38)	5	Kerosene21	T4.1 – T4.5
HU-05: Cálculo de probabilidad de combinada (#39)	5	Sleppyhed / Kerosene21	T5.1 – T5.5


HU-06: Visualización del resultado (#40)	5	Sleppyhed	T6.1 – T6.5
HU-07: Manejo de errores del sistema y API (#41)	5	Kerosene21	T7.1 – T7.5
HU-08: Documentación del sistema (#42)	5	Kerosene21	T8.1 – T8.5

Total de issues creados en el sprint: ~47 issues | Open: 80 | Closed: 33 | Total acumulado: 113

3.4 Estado del Board (Kanban) al Cierre del Sprint

Columna	Cantidad	Items destacados
✓ Done	31	Sprint 2 completado, reuniones, definición del proyecto
□ In Progress	5	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05 (todas sprint 2 tag)
□ Ready	5 (est. 7)	Preparadas para próximo sprint
□ Backlog	4/5	Pendientes de priorización
○ No Status	19	Issues sin clasificar (recién creados)

3.5 Avances en el proyecto

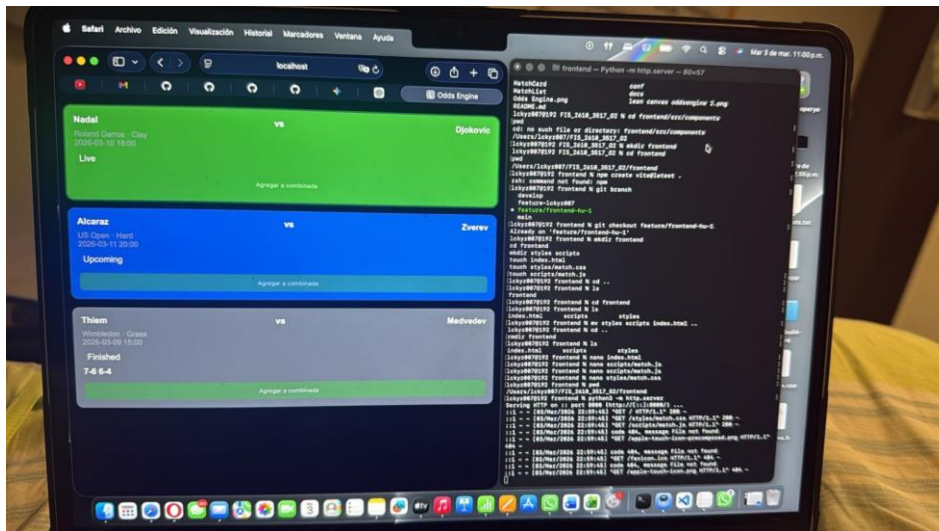


Observación: Front-end (boceto 1) realizado por el miembro lcks el cual contiene y vincula las apis de tenis con una interfaz grafica establecida en las sub-issues del github

The screenshot shows a Jira Scrum board for the project FIS_2610_3517_G2. The board is organized into columns representing different stages of the sprint cycle: No Status, Backlog, Ready, In progress, In review, and Done. Each column contains a list of tasks, each represented by a card with a title, a status icon, and a priority level. The tasks are organized into a backlog and are being moved through the sprint cycle. The 'In progress' column shows tasks that are currently being worked on, while the 'In review' column shows tasks that are being reviewed. The 'Done' column shows tasks that have been completed.

Observación: 26/02/2026 actual del SCRUM (modificando historias de usuario y sub-issues)

The screenshot shows the OddsEngine Wiki page. The page is titled 'Home' and contains a welcome message, a description of the project, and a list of pages. The 'Descripción del Proyecto' section describes the platform as a web application for analyzing sports betting probabilities using probabilistic models. The 'Objetivo del Proyecto' section describes the goal of the project, which is to develop a probabilistic engine capable of calculating the probability of success in sports betting using historical and current information.

Observación: 20/02/2026 Se establecio la wiki del Repositorio

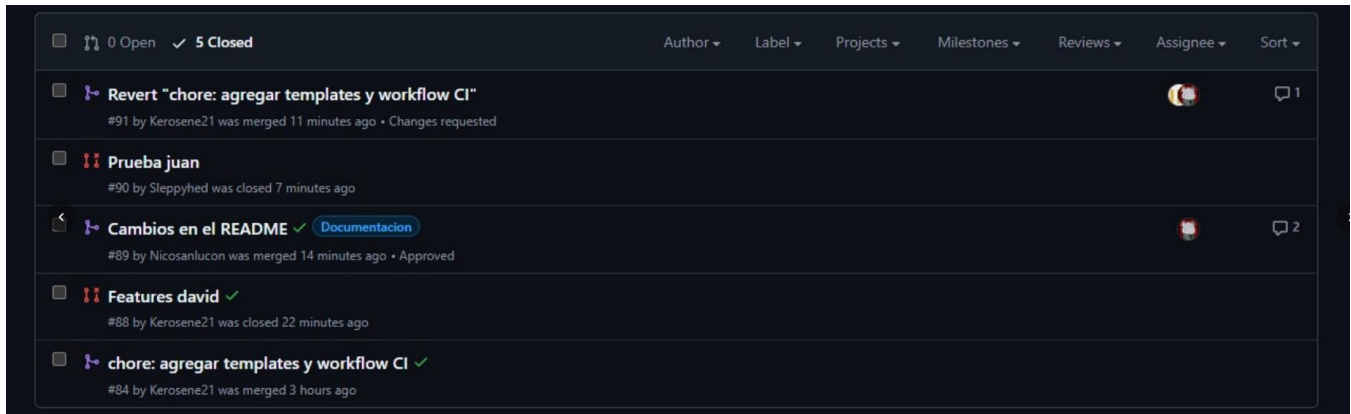

Observación: : 20/02/2026 Asignaciones de las nuevas Branches

4. ¿Qué Salió Bien? (Keep Doing)

✓ FORTALEZAS DEL SPRINT

✓	Refinamiento de backlog exhaustivo y estructurado. Se crearon 47+ issues con criterios de aceptación detallados, Definition of Done, sub-tareas técnicas y estimaciones. Esto es el insumo clave para el Sprint 4.
✓	Formalización de la estructura SCRUM del equipo. Los roles quedaron documentados en el README con 3 commits consecutivos, asegurando claridad en responsabilidades.
✓	Tres PRs mergeados exitosamente (#89, #91, #92), incluyendo uno con revisión formal (approved) en PR #89.
✓	Historias de Usuario bien definidas (HU-02 a HU-08) con estructura consistente: descripción de usuario, criterios de aceptación, DoD, tareas técnicas por capa (Backend, Frontend, Testing).
✓	Reversión oportuna del CI/CD (PR #91). Aunque fue un retroceso, identificar y revertir un cambio problemático antes de que afecte el flujo de trabajo es una buena práctica de ingeniería.
✓	Uso consistente de conventional commits (docs:, chore:, feat:) en los commits del sprint.
✓	El board Kanban refleja 31 ítems en Done, consolidando el trabajo de los sprints anteriores.

6. ¿Qué No Salió Bien? (Stop Doing)

□ PROBLEMAS E IMPEDIMENTOS

Problema identificado	Impacto
-----------------------	---------

☐	Solo 3 commits en toda la semana, todos de documentación. Cero avance en código fuente o implementación técnica durante el sprint.	Alto — retraso en entregables
☐	2 PRs cerrados sin merge: PR #88 (Features david) y PR #90 (Prueba Juan). Trabajo perdido sin integrar al proyecto.	Medio — esfuerzo desperdiciado
☐	HU-01 (Consulta de partidos de tenis) sigue In Progress desde Sprint 2 (Feb 16-20). No se completó la historia principal de sprint anterior.	Alto — deuda técnica acumulada
☐	Implementación de CI/CD (PR #84) fue revertida completamente (PR #91). La estrategia no fue validada antes de implementar.	Medio — retrabajo
☐	Concentración de trabajo: Kerosene21 creó el 80%+ de los issues; Sleppyhed el 100% de los commits. Lcks07 y SrBlondflaxen sin actividad este sprint.	Alto — riesgo de bus factor
☐	19 issues en estado 'No Status' al cierre del sprint. No se completó la clasificación y priorización de todos los nuevos issues.	Bajo-Medio — deuda de proceso
☐	HU-02 a HU-05 marcadas como In Progress sin sub-tareas iniciadas (0/N completadas). Esto puede inflar el WIP (Work in Progress).	Medio — falsa sensación de progreso

7. ¿Qué Mejorar? (Start Doing)

☐ PROPUESTAS DE MEJORA

Las siguientes mejoras se proponen para el Sprint 4 basadas en los hallazgos de este sprint:

Mejoras Técnicas	Mejoras de Proceso
- Implementar CI/CD con validación previa: proponer rama feature/ci-cd, documentar el plan antes de ejecutar. - Iniciar implementación de HU-01 (completar deuda técnica del Sprint 2) como primera tarea del Sprint 4. - Establecer un sprint goal de código: al menos 1 endpoint funcional por sprint. - Usar feature branches para cada Historia de Usuario y sub-tarea.	- Distribuir la creación de issues: asignar a cada miembro la responsabilidad de redactar las tareas de su área. - Limitar WIP: no marcar HU como 'In Progress' hasta que al menos una sub-tarea haya iniciado. - Realizar Sprint Review antes de la Retrospectiva: validar qué Issues/PRs realmente se completaron. - Completar la clasificación de todos los issues en el board al inicio de cada sprint.
